

**БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН  
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН  
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2025 оны 04-р сарын 01-ны өдөр

№

Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум

Хэлэлцсэн асуудал: Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт баригдсан Баянхөндий төслийн уурхайн “Уурхайн нэгдсэн агуулах”-ын барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах, улсын комиссоор хүлээж авах тухай:

Улсын комиссын бүрэлдэхүүн:

Баянхонгор аймгийн Засаг Даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/713 дугаар тоот захирамжийн дагуу байгуулагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс ажиллав. Ирц 100%.

Барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комиссын нарийн бичгийн даргаар Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Барилга угсралтын албаны дарга Г.Даваадорж удирдан явуулав.

1. Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга **С.Хүрэлхуяг**:

**Үүрэг даалгавар:**

- Гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд гүйцэт өгөх
- Холбогдох материал ажлын зургуудыг төрийн архивд хүлээлгэн өгөх

**Санал:** Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээж авах саналтай байна.

2. Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалт, кадастр, зураг төсөл магадлал хариуцсан мэргэжилтэн **Ө.Хандармаа**:

**Үүрэг даалгавар:**

- Бичиг баримтыг барилга тус бүрээр стандартын дагуу архивлаж Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт, аймгийн Архивын хэлтэст хүлээлгэн өгөх
- Барилгын хувийн хэрэг, хөтлөн бүрдүүлэх
- Мэдээллийн санд дөрвөн талын фото зураг, барилгын мэдээлэл гаргаж өгөх, холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөх
- Гүйцэтгэлийн зургийг цахимаар илгээж холбогдох мэдээллийг мэдээллийг гаргаж өгөх, акт зургийн баталгаажуулж техникийн бичиг баримтат хавсаргах

**Санал:** Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр ашиглалтад оруулах саналтай

3. Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын Барилгын материал, үйлдвэрлэл лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

**Ж.Сүглэгмаа:**

**Үүрэг даалгавар:**

- “Одкон салхивч” ХХК дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл материалын тохирлын гэрчилгээний хугацаа дууссан хүчин төгөлдөр тохирлын гэрчилгээ баримт бичигт хийх
- “Мэйджор саплай” ХХК халаалтын сувагт хавтангийн тохирлын гэрчилгээ байхгүй бүрдүүлэх М300
- Элмеко ХХК-ний тохирлын гэрчилгээний хугацаа дууссан
- Барилга болон гадна шугам сүлжээний шугамын бетоны сорилтын үр дүнгүүдийн баримт бичигт хийх Барилгын тухай хуулийн 40.1.12
- Тоосго цонх Улаанбаатар менежментийн арматурын тохирлын гэрчилгээнүүдийг бүрдүүлэх
- Цахилгааны утасны галын дүгнэлтийг бүрдүүлэх

**Санал:** Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр хүлээн авах саналтай.

4. Баянхонгор аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Урангоо:**

**Үүрэг даалгавар:**

- Саналгүй

**Санал:** Комиссын гишүүдийн саналаар ашиглалтад авах

5. Засаг дарга тамгын газрын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого төлөвлөлтийн дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

**Т.Норовринчин:**

**Үүрэг даалгавар:**

- Дээврийн бэхэлгээ хийж, нэмж сайтар хийх
- Цонхны битүүмж сайжруулах
- Дулааны өгөх, буцах шугам өнгөөр ялгаж будах
- Гадна тохижилтын ажил хийх

**Санал:** Дээрх ажлуудыг биелэлтээр авах саналтай байна.

6. Баянхонгор аймгийн Мэдээлэл холбооны Сүлжээ ТӨХК, ерөнхий инженер **Ц.Одонтуяа:**

**Үүрэг даалгавар:**

- Гадна холбооны шилэн кабелийн ороодос зөв эвхэх хаягжуулалт хийх
- Нунтаг галын хорыг паспортжуулах, галын самбар байршуулах
- Зарлан мэдээллийн нэгдсэн системд холболт хийж дуусгах
- Интернэтийн хаягжуулалт хийх

**Санал:** Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр хүлээн авах саналтай

7. Баянхонгор аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **М.Мөнхбат:**

**Үүрэг даалгавар:**

- Саналгүй.

**Санал:** Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах

8. Баянхонгор аймгийн Стандарт хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн хяналтын байцаагч **Ч.Эрдэнэбаатар:**

**Үүрэг даалгавар:**

- Тус барилгад хэмжих хэрэгсэл суурилуулах, үйл ажиллагаа нь хэмжил зүйн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байна.

**Санал:** Ашиглалтад оруулах саналтай байна.

9. Баянхонгор аймгийн Эрчим хүч ЦТ ХХК-ний ерөнхий инженер **Б.Бадамцэцэг:**

**Үүрэг даалгавар:**

- Агуулахын гадна шитний өрөө, дотор ерөнхий шит, салбар шитнүүдэд нэр, хаяг хийж плакат санамж хийх
- Гадна цахилгаан хангамж гүйцэтгэлийн ерөнхий зургийг шитний өрөөнд байрлуулах
- Галын хор аваарын гэрэлтүүлгийн ажиллагааг шалгах протокол үйлдэх
- Шит тус бүрд
- техник ашиглалтын паспорт хөтлөх

**Санал:** Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай.

10. Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Барилга угсралтын албаны дарга **Г.Даваадорж:**

**Үүрэг даалгавар:**

- Захиалагч , гүйцэтгэгчийн чанарын бичиг баримтын явж барилга тус бүрээр танилцуулах

- Улсын комиссын гишүүдийн саналын биелэлт гаргах

**Санал:** Улсын комиссын гишүүдийн саналаар Улсын комиссоор хүлээн авах

**11. Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Барилгын менежер Г.Баярмөнх:**

**Үүрэг даалгавар:**

- Захиалагч, ерөнхий гүйцэтгэгчийн хооронд хийгддэг чанарын баримт бичгүүдийг гүйцээж хийх, төлөвлөгөө гаргах, танилцуулах, баталгаажуулах

**Санал:** Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах

**12. Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Дэд бүтцийн менежер Б.Азжаргал:**

**Санал:** Комиссын гишүүдийн дутуу ажлын үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй

**13. М-Си-Эс Проперти ХХК-ийн Төслийн менежер М.Осоржин:**

**Санал:** Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай

**14. М-Си-Эс-Проперти ХХК-ний Зураг төслийн менежер Ч.Чулуунбат:**

**Санал:** Байнгын ашиглалтад өгөх

### **ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

Улсын комиссын гишүүдийн 100% саналаар байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

С.ХҮРЭЛХУЯГ

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Г.ДАВААДОРЖ



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН НЭГДСЭН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ-н эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: М.Мөнхбат



Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Саналгүй.</p>	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:  Гарын үсэг:   /Тамга, тэмдэг/  М.Мөнхбат Гарын үсгийн тайлал  Огноо: 2025.04.01</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  Гарын үсэг:   /Тамга, тэмдэг/  М.Мөнхбат Гарын үсгийн тайлал  Огноо: 2025.04.14</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН НЭГДСЭН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хот байгуулалт, кадастар, зураг төсөл магадлал хариуцсан мэргэжилтэн


Комиссын гишүүн: Ө.Хандармаа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Бичиг баримтыг барилга тус бүрээр стандартын дагуу архивлаж, ГХБХБГ, аймгийн архивын тасагт хүлээлгэн өгөх</p>	<p>- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын баримт бичгийг стандартын дагуу архивлаж, ГХБХБГ, аймгийн архивын тасагт хүлээлгэн өгөхөд бэлдсэн. Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолын хавсралт "Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах журамд заасны дагуу "Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт" гарснаар аймгийн архивын байгууллагад тушаана. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 1/</p>
<p>- Барилгын хувийн хэрэг хөтлөх бүрдүүлэх</p>	<p>- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын улсын комиссын акт гарснаар болон ерөнхий гүйцэтгэгчээс эцсийн байдлаар баримт бичгийг хүлээн авсны дараа хувийн хэргийг хөтлөж, бүрдүүлэлт хийнэ.</p>
<p>- Мэдээллийн санд 4 талын фото зураг, барилгын мэдээллийг гаргаж өгөх, холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөх</p>	<p>- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын мэдээллийн санд 4 талын фото зураг хавсаргав. Барилгын холбогдох мэдээллийг цаг тухай бүрт гарган өгч хамтарч ажиллана. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 2/</p>
<p>- Гүйцэтгэлийн зургийг цахимаар илгээж, холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөх, акт зургийг баталгаажуулж техникийн биш баримтад хавсаргах</p>	<p>- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэн өгсөн актыг хавсаргав. /Хавсралт - 3/</p>
<p>Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр ашиглалтанд оруулах саналтай.</p> <p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ О. Хандармаа / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 04. 01</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ О. Хандармаа / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 04. 01</p>

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 1

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын баримт бичгийг стандартын дагуу архивлаж, ГХБХБГ, аймгийн архивын тасагт хүлээлгэн өгөхөд бэлдсэн. Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолын хавсралт "Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах журамд заасны дагуу "Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт" гарснаар аймгийн архивын байгууллагад тушаана.

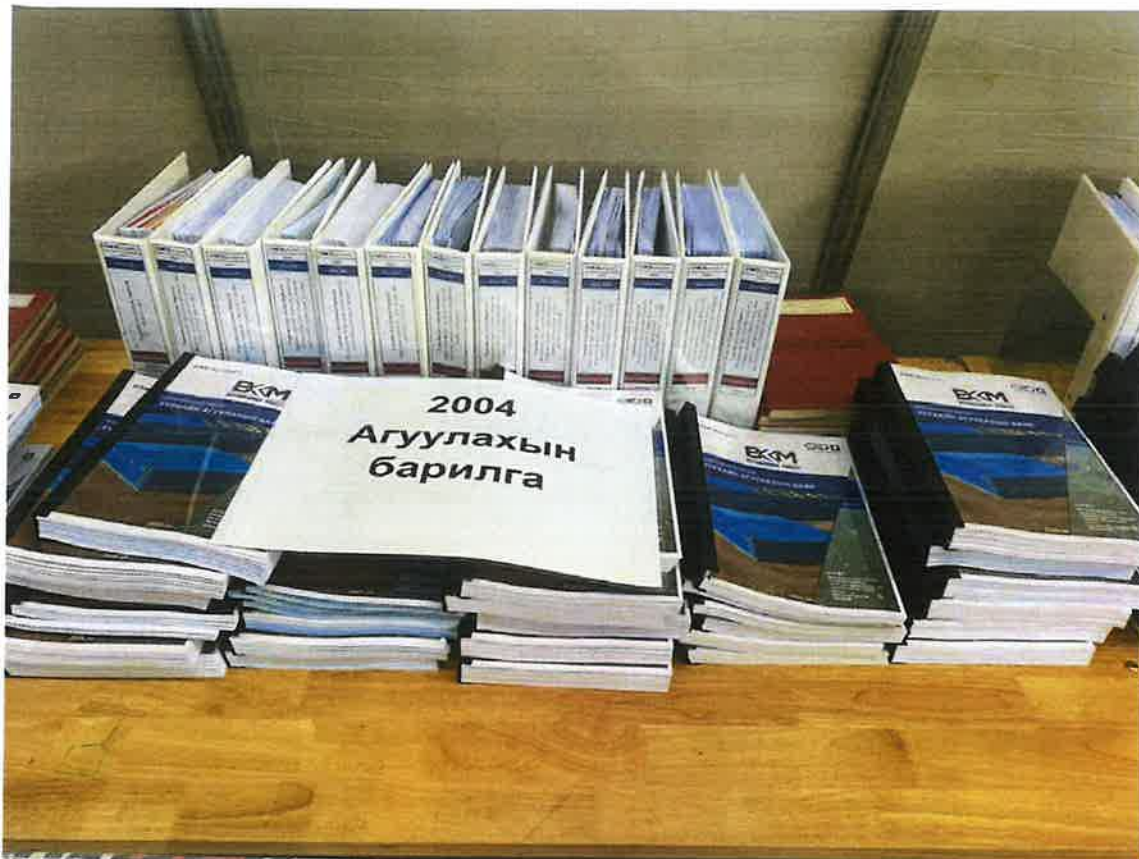

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын мэдээллийн санд 4 талын фото зураг хавсаргав. Барилгын холбогдох мэдээллийг цаг тухай бүрт гарган өгч хамтарч ажиллана.



БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН  
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР  
АКТ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
ЗУРАГЛАЛЫГ ШАЛГАЖ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ХҮЛЭЭН АВСАН

2025 оны 02 сарын 14 Дугаар 01 / 2025 Баянхонгор аймаг

1. "Эрдэнэ Монгол" ХХК  
(захирал, гч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
2. "Баянхөндий Уурхайн" Боловсруулах Үйлдвэр болон дагалдах барилга байгууламжийн гадна шугам сүлжээний ажил (Дулааны шугам, Цэвэр усны шугам, Цахилгаан дамжуулах кабелийн шугам, Бохирын шугам, Холбооны шугам)"-ын 1:500-ны масштабтай байр зүйн гүйцэтгэлийн зураг
3. "М-Си-Эс Проперти" ХХК  
(гүйцэтгэлийн зураглал хийх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
4. Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын барилга, шугам сүлжээний мэдээллийн сан  
(хүлээн авсан мэдээллийн сангийн нэр)

Мэдээллийн санд хүлээн авсан:

(нэр, гарын үсэг)

Баянхонгор аймгийн ГХБХБГазрын мэргэжилтэн:

Гүйцэтгэлийн зургийг хүлээлгэн өгсөн:

(иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны нэр, гарын үсэг)

"М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Геодезийн инженер *Баяржавлалт* Б.Баяржавлалт

"М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Геодезийн ахлах инженер: *П.Лхагва* П.Лхагва



БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН  
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР  
АКТ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
ЗУРАГЛАЛЫГ ШАЛГАЖ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ХҮЛЭЭН АВСАН

2025 оны 02 сарын 14

Дугаар 02 / 2025

Баянхонгор аймаг

1. "Эрдэнэ Монгол" ХХК

(захиралгач иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)

2. Уурхайн Химийн бодисын агуулахын барилга, Агуулахын барилга, Шинжилгээ болон Металлургийн лабораторын барилга, Дулааны станцын барилга, Шалган нэвтрүүлэх байр, Дэд өртөөний барилга, Гадна цахилгааны (Давтамж хувиргуурын барилга), Уурхайн Оффисын барилга 1:500-ны масштабтай байр зүйн гүйцэтгэлийн зураг

3. "М-Си-Эс Проперти" ХХК

(гүйцэтгэлийн зураглал хийх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)

4. Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын барилга, шугам сүлжээний мэдээллийн сан

(хүлээн авсан мэдээллийн сангийн нэр)

Мэдээллийн санд хүлээн авсан:

(нэр, гарын үсэг)

Баянхонгор аймгийн ГХБХБГазрын мэргэжилтэн:



Б.Отгончимэг /

Гүйцэтгэлийн зургийг хүлээлгэн өгсөн:

(иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны нэр, гарын үсэг)

"М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Геодезийн инженер:



Б.Баяржавхлан

"М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Геодезийн ахлах инженер:

Н.Ахалма





Н.Ахалма /

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН НЭГДСЭН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЦТХК-ны ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Б.Бадамцэцэг

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Агуулахын байрны гадна шитний өрөө, дотор ерөнхий шит, салбар шитнүүдэд нэр, хаяг хийж, плакат санамж хийх</p>	<p>- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын шитний өрөө тусгагдаагүй, дотор ерөнхий шит, салбар шитнүүдэд нэр, хаяг хийж, плакат санамж хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 1/</p>
<p>- Гадна цахилгаан хангамж гүйцэтгэлийн ерөнхий зургийг шитний өрөөнд байрлуулах</p>	<p>- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын гадна цахилгаан хангамж гүйцэтгэлийн ерөнхий зургийг шитний өрөөнд байрлуулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 2/</p>
<p>- Галын хор, аваарын гэрэлтүүлгийн ажиллагааг шалгах протокол үйлдэх</p>	<p>- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын аваарын гэрлийн ажиллагааг шалгасан акт хавсаргав. /Фото зураг болон акт хавсаргав. Хавсралт - 3/</p>
<p>- Шит тус бүрт техник ашиглалтын паспорт хөтлөх</p> <p>Байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.</p>	<p>- Эрдэнэ Монгол ХХК нь WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын улсын комиссын акт гарч, ашиглалтад орсны дараа бүх барилгын шит, тоног төхөөрөмжийг нэгдсэн журмаар дугаарлан, стандартын дагуу бүртгэж, хөтлөх ажлыг хийнэ. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 4/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.01</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.14</p>

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 1


WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын шитний өрөө тусгагдаагүй, дотор ерөнхий шит, салбар шитнүүдэд нэр, хаяг хийж, плакат санамж хийсэн.



## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2


WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын гадна цахилгаан хангамж гүйцэтгэлийн ерөнхий зургийг шитний өрөөнд байрлуулсан.

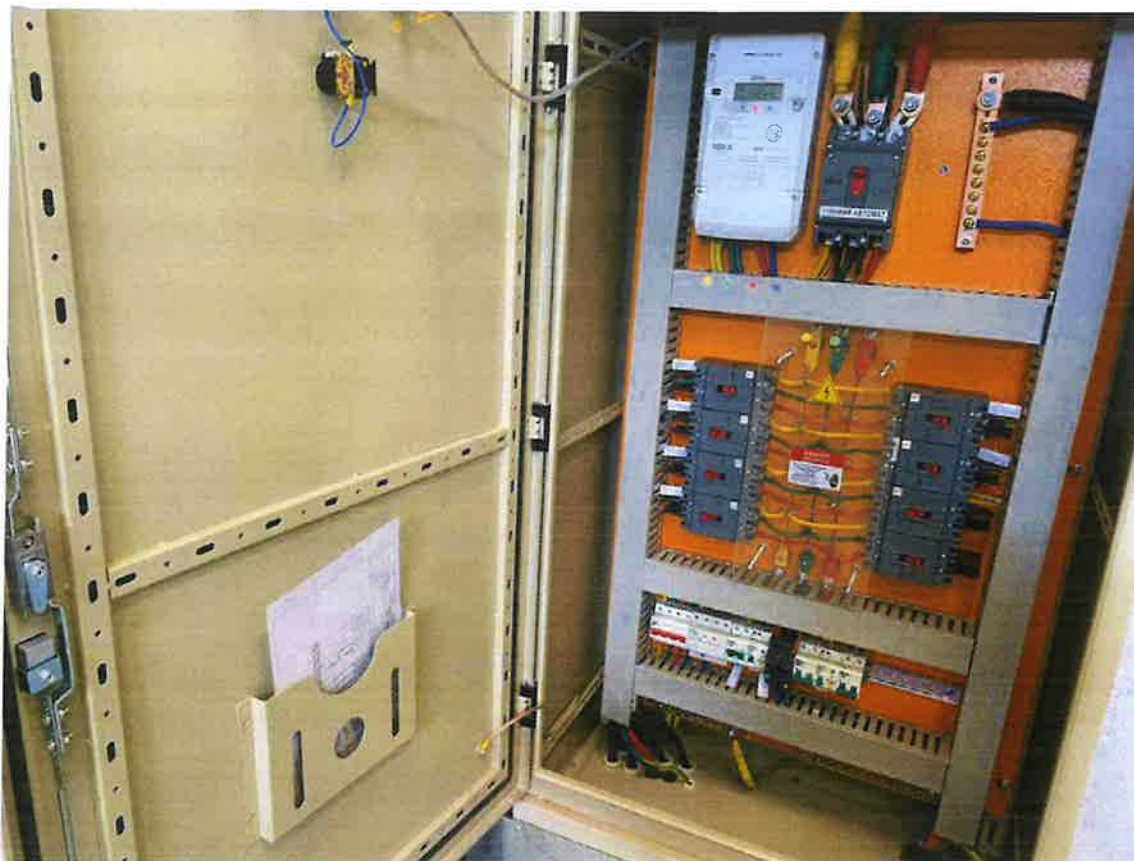

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 3

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын аврах гарц схемд заасны дагуу гал унтраагуур, галын самбар, сар тутмын үзлэгийн пайз хийж байршуулсан.

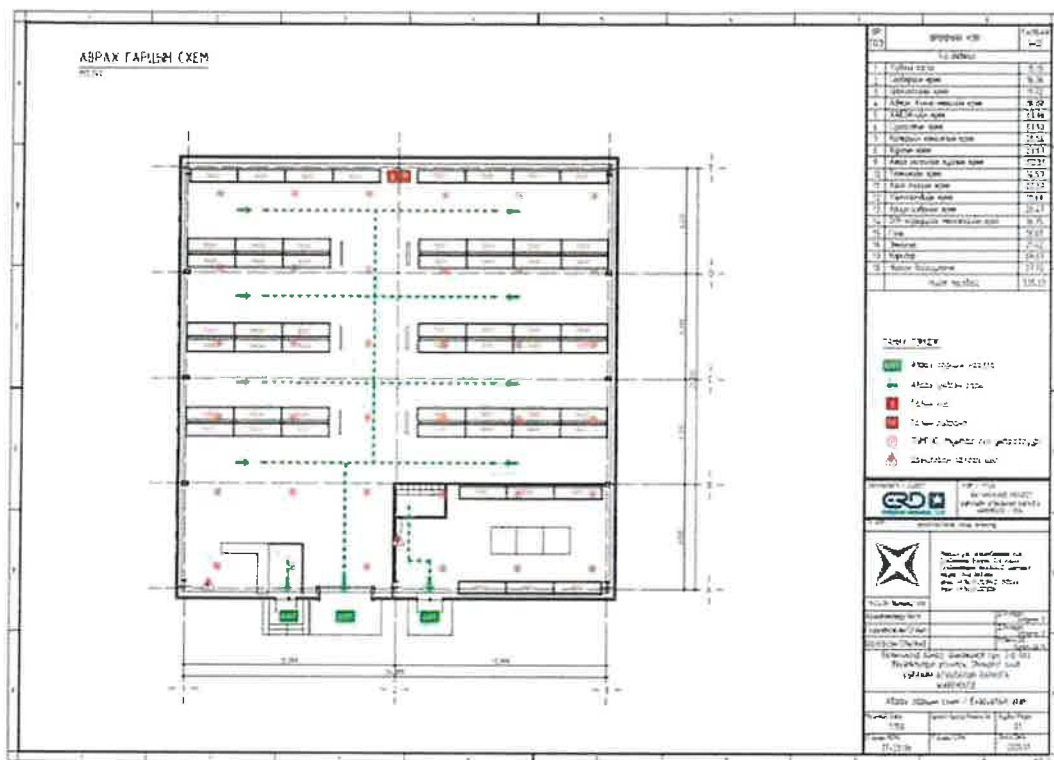

Хүснэгт 1. Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгад байршуулсан гал унтраах, илрүүлэх, мэдээллэх хэрэгслүүд

№	Гал унтраах, илрүүлэх хэрэгсэл	Тоо	Байршил
1	ABC-5 кг-тай гал унтраагуур	2	Уурхайн нэгдсэн агуулах
2	Галын аюулгүй ажилгааны самбар А-1 хэмжээтэй	1	Уурхайн нэгдсэн агуулах
3	CO2-гал 10-кг-тай унтраагуур	1	Уурхайн нэгдсэн агуулах
4	Гал унтраагуурын сар тутмын үзлэгийн пайз	3	Уурхайн нэгдсэн агуулах

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 3

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын аврах гарц схемд заасны дагуу гал унтраагуур, галын самбар, сар тутмын үзлэгийн пайз хийж байршуулсан.



## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 3

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын аваарын гэрлийн ажиллагааг шалгасан акт хавсаргав.



M-86

**ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
АКТ**

№ 1

**Агуулахын барилга**  
/объектын нэр/

2025 оны 02 сарын 26 өдөр

Комисс дээрх бүрэлдэхүүнээр **Баянхонгор аймаг Шинэжинст сумын Уртын голын 2-р багт баригдаж буй "Эрдэнэ Монгол" ХХК-н Баянхөндий төслийн Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилга** дотор гэрэлтүүлгийн угсралтын ажлыг **Эрдэнэ Монгол ХХК-н Б.Азжаргал** /захиалагчийг төлөөлж/ **"Гексаэдр Клауд" ХХК-н инженер Н.Түвшинтайван** /гүйцэтгэгчийг төлөөлж/

Байгууламжинд: **Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын дотор гэрэлтүүлгийн угсралтын ажлыг** хийж гүйцэтгэсэн тул акт тогтоов.

Тоноглолууд ба материалууд:

1. Тоноглолууд:

- **4000K буюу цайвар шар гэрлийн өнгөтэй, 1\*36W чадалтай Лед буюу эрчим хүчний хэмнэлттэй, ус чийгээс хамгаалсан IP65 хамгаалалттай ZL-WPLP40-SMD-4FT(-S) маркийн гэрэлтүүлгийг агуулахын хэсэгт угсарсан,**  
- **Ус чийгээс хамгаалагдсан IP65 хамгаалалттай, аваарын үед 3 цаг тасралтгүй ажиллах чадалтай ослын гэрэлтүүлэгчийг агуулахын барилгад ил угсарч суурьлуулсан.**

Кабель: .....**Гэрэлтүүлгийн кабель шугамын ажлыг 3Т-23/06 шифртэй зургийн ДГ-01 хуудсыг үндэслэн 2004-ГС-001 дугаартай самбараас унтраалга болон гэрэлтүүлэг хүртэл ПВ3 маркийн 1х2,5мм<sup>2</sup> голчтой кабелийг Ø20мм-н цайрдсан ган хоолойгоор ил сунгаж угсарсан**.....

Гүйцэтгэсэн нэмэлт ажлууд: **Дотор гэрэлтүүлгийн угсралтын ажлын Ø20мм-н цайрдсан ган хоолойг 1м тутам зориулалтын тогтоогч ашиглан бат бөх бэхэлсэн**

Тайлбар: **Агуулахын барилгыг гэрлийн тусгалын хэмжээг зориулалтын багажаар хэмжихэд 488.7лк байв. Иймд уг ажлыг байнгын ашиглалтад БЭЛЭН гэж үзэв.**

Захияпагч байгууллагыг талаарж:



Б. Азжаргал

Гүйцэтгэгч байгууллагыг төлөөлж:  Н.Түвшинтайван/

### Хавсралт - 3

М-Актны дугаар №:  Гүйцэтгэгч:

Ажлын талбар:

Ажлын дугаар:  Акт бичсэн огноо:


Зураг №1



Ажлын нэр, тайлбар:

4000К буюу цайвар шар гэрлийн өнгөтэй, 1\*36W чадалтай Лед буюу эрчим хүчний хэмнэлттэй, ус чийгээс хамгаалсан IP65 хамгаалалттай ZL-WPLP40-SMD-4FT(-S) маркийн гэрэлтүүлгийг уурхайн нэгдсэн агуулахын хэсэгт угсарсан

Зураг №2

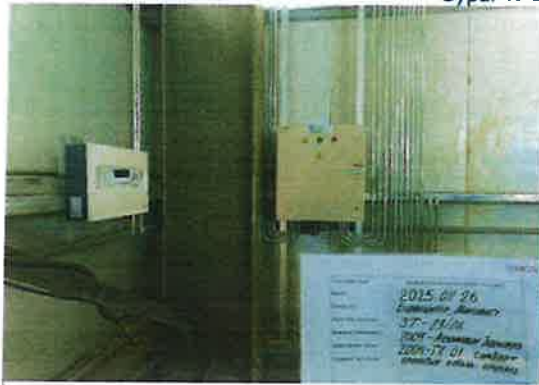

Ажлын нэр, тайлбар:

Уурхайн нэгдсэн агуулахын дотор гэрэлтүүлгийн 3х/1х2.5/ мм2 кабелийг ф20мм-н цайрдсан ган хоолой болон ф16мм-н уян хоолойд сүвлэж угсрав

Зураг №3




Ажлын нэр, тайлбар:

Уурхайн нэгдсэн агуулахын гэрлийн тусгалын хэмжээг FLUS ET-F965 багажаар хэмжихэд 488.7Лк байв

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 4

Эрдэнэ Монгол ХХК нь WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын улсын комиссын акт гарч, ашиглалтад орсны дараа бүх барилгын шит, тоног төхөөрөмжийг нэгдсэн журмаар дугаарлан, стандартын дагуу бүртгэж, хөглөх ажлыг хийнэ.

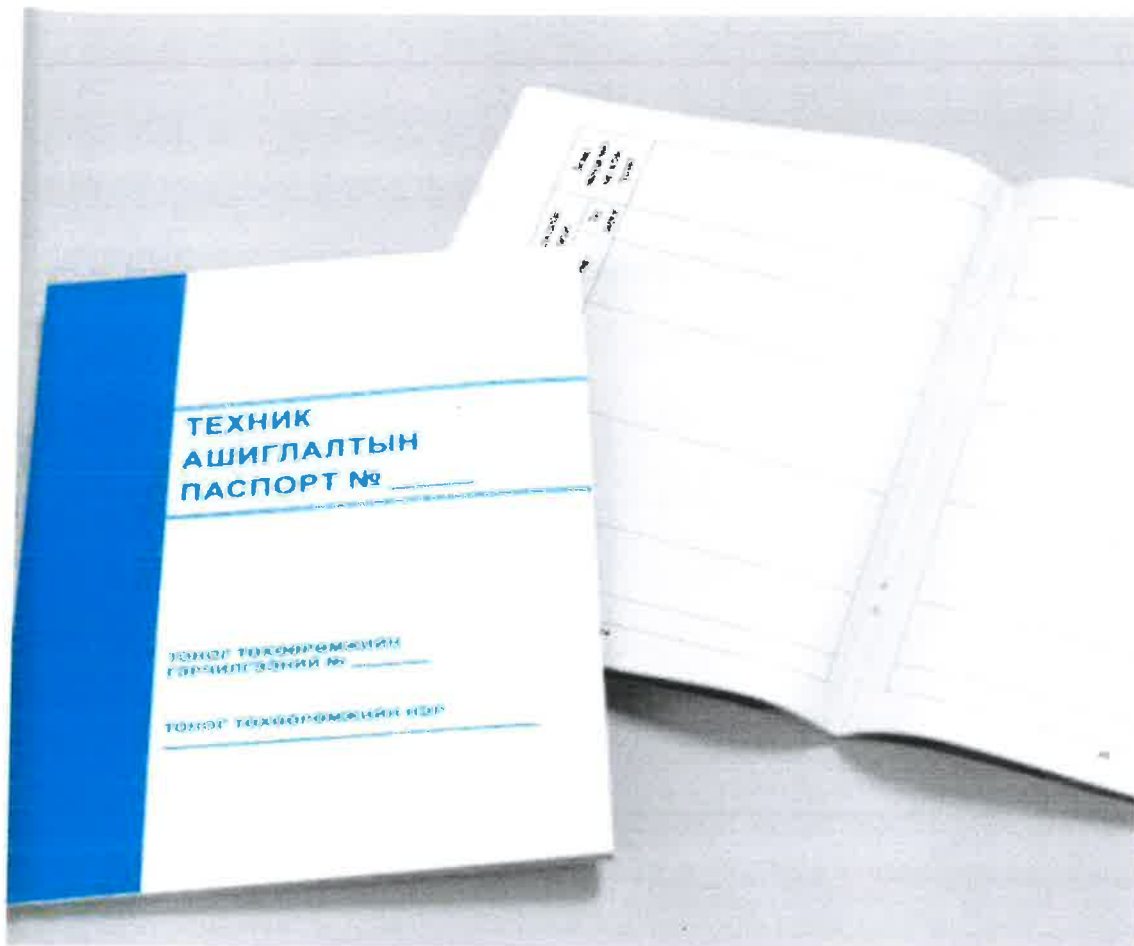



**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН НЭГДСЭН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: Ч.Эрдэнэбаатар

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Тус барилгад хэмжих хэрэгсэл суурилуулах үйл ажиллагаа нь хэмжил зүйн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байна</p> <p>Ашиглалтад оруулах саналтай байна.</p>	<p><i>Үүрэг даалгавар биелсэн.</i></p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ч.Эрдэнэбаатар</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.01</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ч.Эрдэнэбаатар</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.11</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН НЭГДСЭН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: Ц.Урангоо



Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Саналгүй.</p> <p>Комиссын гишүүдийн саналаар ашиглалтад авах саналтай.</p>	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ц. Урангоо</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p><i>Ц. Урангоо</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.01</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ц. Урангоо</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p><i>Ц. Урангоо</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.14</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН НЭГДСЭН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Бүс орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Дээврийн бэхлэгээ нэмэж сайтар хийх	- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын дээврийн бэхлэх ажлыг сайжруулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 1/
- Цонхны битүүмж сайжруулах	- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын цонхны битүүмж сайжруулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 2/
- Дулааны өгөх буцах шугам өнгөөр ялгаж будах	- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын дулааны өгөх буцах шугам өнгөөр ялгаж будсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 3/
- Гадна тохижилтын ажил хийх	- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын гадна талбайн тохижилтын ажлыг ажлын зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 4/
Дээрх ажлуудын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:	Огноо:

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 1

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын дээврийн бэхлэх ажлыг сайжруулсан.



## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын цонхны битүүмж сайжруулсан.



## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 3

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын дулааны өгөх буцах шугам өнгөөр ялгаж будсан.



## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 4

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын гадна талбайн тохижилтын ажлыг ажлын зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн.







Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН НЭГДСЭН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, ерөнхий байцаагч

Комиссын гишүүн: Ц.Одонтуяа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Гадна холбооны шилэн кабелийн ороодос зөв эвхэх, хаягжуулалт хийх	- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын гадна холбооны шилэн кабелийн ороодос зөв эвхсэн, хаягжуулалт хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 1/
- Нунтаг галын хорыг паспортжуулах галын самбар байршуулах	- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгад гал унтраах, илрүүлэх, мэдээлэх хэрэгслүүдийн мэдээлэл болон зургийг хавсаргаж биелэлтийг хангуулав. /Хавсралт - 2/
- Зарлан мэдээллийн нэгдсэн системд холболт хийж дуусгах	- Нийт барилгын зарлан мэдээллийн системүүдийн угсралт, тохируулгын ажил бүрэн дууссаны дараа төв системд нэгтгэн, цогц байдлаар бүрэн ажиллагаанд оруулна. Одоогоор 2001, 2003, 2008, 2009, 2020, 3006, 7003, 7005 дугаартай барилгуудын зарлан мэдээллийн системүүд бие даан ажиллаж байгаа бөгөөд үлдсэн барилгуудын системийг бүрэн суурилуулсны дараа төв системд холбох ажлыг гүйцэтгэнэ. /Хавсралт - 3/
- Интернетийн хаягжуулалт хийх	- WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын интернетийн хаягжуулалт хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 4/
Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр хүлээн авах саналтай байна.	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.01</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.14.</p>

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 1


WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгын гадна холбооны шилэн кабелийн ороодос зөв эвхсэн, хаягжуулалт хийсэн.



## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгад гал унтраах, илрүүлэх, мэдээллэх хэрэгслүүдийн мэдээлэл болон зургийг хавсаргаж биелэлтийг хангуулав.

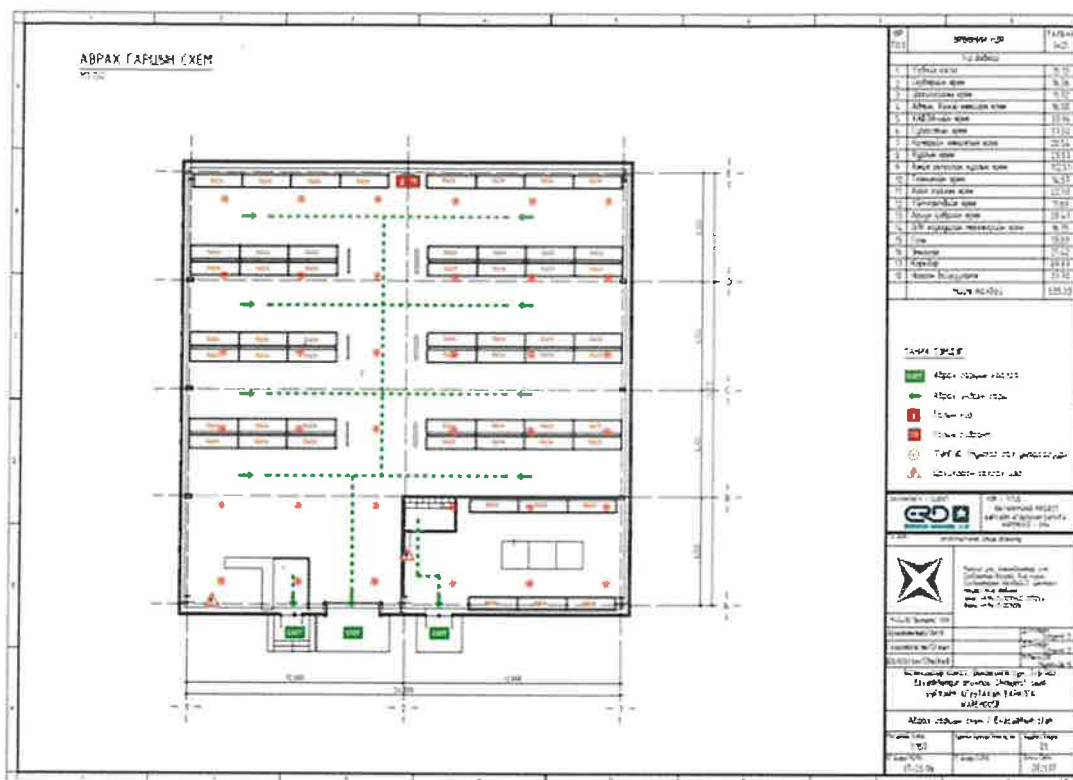

Хүснэгт 1.

№	Гал унтраах, илрүүлэх хэрэгсэл	Тоо	Байршил
1	АВС-5 кг-тай гал унтраагуур	2	Уурхайн нэгдсэн агуулах
2	Галын аюулгүй ажилгааны самбар А-1 хэмжээтэй	1	Уурхайн нэгдсэн агуулах
3	CO2-гал 10-кг-тай унтраагуур	1	Уурхайн нэгдсэн агуулах
4	Гал унтраагуурын сар тутмынүзлэгийн пайз	3	Уурхайн нэгдсэн агуулах

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын барилгад гал унтраах, илрүүлэх, мэдээллэх хэрэгслүүдийн мэдээлэл болон зургийг хавсаргаж биелэлтийг хангуулав.

Зураг 1. Уурхайн нэгдсэн агуулахын байранд байршуулсан зураг.



Зураг 2. Гал унтраагуурын пайз, галын аюулгүй ажиллагааны самбар.

**ГАЛЫН ХОРНЫ ШАЛГАХ ХУУДАС**

№

САР	2025	2026	2027
I	✓		
II	✓		
III	✓		
IV	✓		
V			
VI			
VII			
VIII			
IX			
X			
XI			



## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 3

Нийт барилгын зарлан мэдээллийн системүүдийн угсралт, тохируулгын ажил бүрэн дууссаны дараа төв системд нэгтгэн, цогц байдлаар бүрэн ажиллагаанд оруулна. Одоогоор 2001, 2003, 2008, 2009, 2020, 3006, 7003, 7005 дугаартай барилгуудын зарлан мэдээллийн системүүд бие даан ажиллаж байгаа бөгөөд үлдсэн барилгуудын системийг бүрэн суурилуулсны дараа төв системд холбох ажлыг гүйцэтгэнэ.

Барилгуудын нэршил	Зарлан мэдээлэх системийн ашиглалтад орсон байдал
1000 - Боловсруулах үйлдвэр	2025.04.29
2020 - Лаборатори	Тийм
2001 - Уурхайн захиргааны барилга	Тийм
2008 - Дулааны станц	Тийм
2005 - Хүнд, хөнгөн машин механизмын засварын газар	2025.04.16
2003 - Химийн бодисын агуулах	Тийм
2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулах	Тийм
1015 - Боловсруулах үйлдвэрийн оффис	2025.04.10
2009 - Шалган нэвтрүүлэх байр 2	Тийм
2016 - Уурхайн ажилчдын амрах байр	2025.04.16
2016.01 - Халаалтын зуухны барилга	2025.04.16
2016.02 - Хувцас угаалга, авто зогсоолын барилга	2025.04.16
2016.04 - Шалган нэвтрүүлэх байр	2025.04.16
2016.06 - Харуулын байр	2025.04.16
7003 - Цахилгааны дэд өргөө	Тийм
7005 - Давтамж хувиргуурын байгууламж	Тийм

### Зарлан мэдээлэх систем

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОЛТ, УДИРДЛАГА



2001 – Хяналтын өрөөнд “Төвлөрсөн хяналтын цэг (Central control panel)” байрлана

----- Шилэн кабель  
 - - - - - STP кабель

## Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 4

WBS 2004 - Уурхайн нэгдсэн агуулахын интернетийн хаягжуулалт хийсэн.







**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН НЭГДСЭН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Ж.Сүглэгмаа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Одкон салхивч ХХК дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл материалын тохирлын гэрчилгээний хугацаа дууссан хүчин төгөлдөр тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хийх</p> <p>- Мэйджор саплай ХХК халаалтын сувгийн хавтангийн тохирлын гэрчилгээ байхгүйг бүрдүүлэх М300</p> <p>- Элмеко ХХК-ын тохирлын гэрчилгээ дууссан</p> <p>- Барилга болон гадна шугам сүлжээний шугамын бетоны сорилтын үр дүнгүүдийг үр дүнгүүдийг баримт бичигт хийх БТХ-ын 40.1.12</p> <p>- Тоосго, цонх, УБ менежментийн арматурын тохирлын гэрчилгээнүүдийн бүрдүүлэх</p> <p>- Цахилгааны утасны галын дүгнэлтийг бүрдүүлэх</p> <p>Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр хүлээн авах саналтай.</p>	<p>- "Одкон салхивч" ХХК-ийн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл материалын хүчинтэй тохирлын гэрчилгээг хавсаргав. /Хавсралт – 1/</p> <p>- "Мэйджор саплай" ХХК -ийн нийлүүлсэн шугамын тэвш болон тагны хүчин төгөлдөр, тохирлын гэрчилгээг хавсаргаж биелэлтийг хангуулав. /Хавсралт – 2/</p> <p>- "Элмеко" ХХК -ийн хүчин төгөлдөр, тохирлын гэрчилгээг хавсаргаж биелэлтийг хангуулав. /Хавсралт - 3/</p> <p>- Барилгын бетон сорилтын үр дүнгүүд барилгын ил далд ажлын актуудад хавсрагдсан, гадна дулааны шугам сүлжээний цутгагдсан бетоны лабораторийн сорилтын үр дүнгүүдийг хавсаргаж биелэлтийг хангуулав. /Хавсралт - 4/</p> <p>- "Арвайн дэвшил" ХХК нийлүүлсэн барилгын материалын /Тоосго/ тохирлын гэрчилгээг хавсаргасан. Тус компаний тохирлын гэрчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө бараа материалыг нийлүүлж угсралтын ажил хийгдэж дууссан. "Улаанбаатар менежмент" ХХК нийлүүлсэн барилгын материалын /арматур/ хүчин төгөлдөр, тохирлын гэрчилгээг хавсаргасан."Вакум цонх" ХХК нийлүүлсэн барилгын материалын /цонх/ тохирлын гэрчилгээний хугацааг сунгуулаж шинээр авах хариу хүлээгдэж байна. Албан бичгийг хавсаргав. /Хавсралт - 5/</p> <p>- Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн цахилгааны утасны гадна бүрхүүлд хийсэн онцгой байдлын галын дүгнэлтийг хавсаргав. /Хавсралт – 6/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Гамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.15</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Гамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.15</p>



Хавсралт - 1

# ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар: ДБ11/23



## БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА

(Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр)

Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу 46, 26-1 байр 2-201 тоот

Аж ахуйн нэгж /байгууллага/:

**Нэр:** "ОДКОН САЛХИВЧ" ХХК

**Хаяг:** Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, "Одконхолдинг" ХХК-ийн үйлдвэр сургалтын төв

**Утас/факс:** 75758229, 99182456

**И-Мэйл:** odconvent@odcon.mn

Энэхүү гэрчилгээг олгоход үндэслэсэн баримт бичгүүд:

**1. Сорилтын үр дүнгийн дугаар, огноо:**

Бүтээгдэхүүний 2023.01.23-ны өдрийн 0000095, 0000096 дугаартай баталгаажуулалтын сорилтын үр дүн ба 2022 оны хөндлөнгийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилт туршилтын үр дүнгүүд

**2. Сорилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр:**

БХБЯ-ны БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

**3. Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэр:**

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2023.02.14-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр

Бүтээгдэхүүн /үйлчилгээний тодорхойлолт:

Нэр:

БТКУС-ийн код:

Стандарт, НТББ-н тэмдэглэгээ:

**ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙН  
ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТЫН  
ХӨӨСӨН ПОЛИУРЕТАН БҮРХҮҮЛ**

68.06

MNS 5352:2004

Баталгаажуулалт явуулсан схем: 2

Дээрх бүтээгдэхүүн нь холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичиг (НТББ)-ийн шаардлагыг хангаж байгаа тул энэхүү **ГЭРЧИЛГЭЭ**-г олгов.

Баталгаажуулалтын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан:

Баталгаажуулалтын шинжээч:



.....**Ф.Мягмар**



.....**С.Тунгалаг**

Олгосон огноо: 2023.02.14

Дуусах огноо: 2025.02.14



# ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

## БАРИЛГА АРХИТЕКТУР КОРПОРАЦИ



www.bak.barilga.mn

51/24

057

Аж ахуйн нэгж/байгууллага/иргэн:

“МЭЙДЖОР САПЛАЙ” ХХКОМПАНИ  
БТДүүрэг 20-р хороо, Баруун үйлдвэрийн бүс  
/1 6101/, Эрчим хүчний гудамж-37/3 тоотод  
байрлалтай.

Цахим хаяг: info@majorsapply.mn  
www.majorsupply.mn  
у/ф: 77063355  
у: 99051025, 99051207, 99012890

Энэхүү гэрчилгээг олгоход үндэслэсэн баримт бичгүүд:

- Сорилтын үр дүнгийн дугаар, огноо:  
24/158 тоот баталгаажуулалтын болон 2024 онд хийсэн сорилт туршилтын үр дүн
- Сорилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр  
БАРИЛГА АРХИТЕКТУР КОРПОРАЦИЙН СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ
- Удирдлагын тогтолцооны нэр, гэрчилгээний дугаар, олгосон байгууллагын нэр  
ҮББ 51/24  
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2024.11.29-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ  
БАРИЛГА АРХИТЕКТУР КОРПОРАЦИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА  
ТӨМӨР БЕТОН ЭДЛЭХҮҮН БАТАЛГААЖУУЛАХ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН СХЕМ

Бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний тодорхойлолт:

No.	Нэр, төрөл:	БТКУС-ийн код:	Стандарт, НТББ-ийн тэмдэглэгээ:
	ДУЛААНЫ ШУГАМЫН Л2, Л4 Л5, Л7, Л9, Л10 МАРКИЙН ТӨМӨР БЕТОН ТЭВШ	6810.91.50	MNS 3875:1986 MNS 3997:1987
	ХАЛААЛТЫН ШУГАМЫН ТӨМӨР БЕТОН ТАГ		

Дээрх бүтээгдэхүүн/үйлчилгээ нь холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичиг (НТББ)-ийн шаардлагыг хангаж байгаа тул энэхүү **ГЭРЧИЛГЭЭ**-г олгов.

Баталгаажуулалтын  
албаны дарга  
Д.Хайсамбуу  
гарын үсэг

Баталгаажуулалтын  
шинжээч  
Ж.Янжмаа  
гарын үсэг

2024.11.29  
Олгосон огноо  
2026.11.29  
Дуусах огноо



Улаанбаатар хот, БЗД-н 13-р хороо, АОС-71 тоот  
Утас: 88026664  
E-mail: otgoo@elmeco.mn

№ \_\_\_\_\_  
танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_  
Т \_\_\_\_\_

М Си Эс проперти ХХК албан бичиг шаардлага хүргүүлэх тухай

Элмеко ХХК нь Хайнаг Металл хийц ХХК РД: 6946488 компани үйлдвэрлэсэн  
Кабелийн шатан тавиурын М Си Эс проперти ХХК-д нийлүүлсэн болно.

Тиймээс Хайнаг Металл хийц ХХК-ын тохирлын гэрчилгээ нь манай нийлүүлсэн  
кабелийн тавиурын тохирлын гэрчилгээ мөн болно.

Хүндэтгэсэн:  / Захирал Д.Отгонбат /

2025оны 04-р сарын 11



ХАРИЛЦАГЧИД -нд

№ \_\_\_\_\_  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

ТОДОРХОЙЛОЛТ

М Си Эс пропэрти ХХК гүйцэтгэхээр ажиллаж байгаа Баянхонгор аймаг Шинэжинст суманд хэрэгжүүлж буй Баян хөндий төслийн барилга байгууламжид ашигласан кабелийн тавиурыг "Хайнаг Металл хийц ХХК" РД: 6946488 үйлдвэрлэж "Элмеко ХХК" -д нийлүүлсэн үнэн болно.

Захирал



Д Бямбадорж



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

УБД14030

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр



Аж ахуйн нэгж, байгууллага/иргэн:

Нэр: "Хайнаг металл хийц" ХХК

Регистр: 6946488

Утас/Факс: 88115011, 88099099

И-мэйл: khainagmcp@gmail.com

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сөнгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо, Баруун түрүү Эшгэр 124 тоот

Энэхүү гэрчилгээг олгоход үндэслэсэн баримт, бичгүүд:

- 1. Сорилтын дүнгийн дугаар, огноо: ЭХНЛ/145/2024 2024-10-01
- 2. Сорилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр: Эрчим хүчний нэгдсэн лаборатори /Металлын лаборатори/
- 3. Удирдлагын тогтолцооны нэр, гэрчилгээний дугаар, олгосон байгууллагын нэр:

СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн, баталгаажуулалтын Зөвлөлийн 2024 оны 11 сарын 15-ны өдрийн 07/2024 тоот хуралдааны тэмдэглэл

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тодорхойлолт:

- 1. Иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө, олон нийтийн болон үйлдвэрийн барилгын хуваарилах самбар, орон сууцны цахилгааны самбар, шатан тавиур 8504 MNS 5834:2008, MNS 5644:2006, MNS 6520:2015, MNS 5643:2006

Дээрхи бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичиг (НТББ)-ийн шаардлагыг хангаж байгаа тул энэхүү ГЭРЧИЛГЭЭ-г олгов.

В. ГАНЗОРИГ  
 Эрх бүхий албан тушаалтан  
 Сарын үсэг/нэр

А. НӨРГҮЙСАЙХАН  
 Шалжээч/эксперт  
 Сарын үсэг/нэр



2024-11-15  
 Олгосон огноо  
 002120  
 2027-11-15  
 Дуусах огноо



PREMIUM  
Building Materials

# СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ

Quality certification of ready mixed concrete

Standard/Standard MCS 1185 1998, MCS EN 206 2017

№ 0011735

Огноо/Date: 2004.04.29 Тест хийсэн цаг/Time of testing 11:20

Зөвлөхөөрх компани/Contractor MCS PROPERTY

Төслийн нэр/Name of the project БАЛХОНДНИЙ

Байршил/Location: ХРВАГ №5

Цутгасан бүтэц/Type of pour ХАНА БЕТОН

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	115
2	Төслийн бэлтгэл (28 day strength)	Мпа   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	C   B   M	C16/B20/М
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	13,4
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	14,4
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	200
7	Агаарын агууламж (Air content)	%	5,0
8	Авсан бетон сорьцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	SIKA-5510
10	Дүүргэгчийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/

С.ДЭДЭНСОДНОМ

Гарын үсэг/Signature/

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/

П.ОЛЗОГ

Гарын үсэг/Signature/

**PREMIUM**  
BUILDING MATERIALS

# СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ  
Quality certification of ready mixed concrete

№ 0009633

Огноо/Date: 2024.04.27 Тест хийсэн цаг/Time of testing: 09:55

Захиалагч компани/Contractor: М-Сү-Эс проптерсү

Төслийн нэр/Name of the project: БМЦХ хэвчин

Байршил/Location: АУМААВАХАВАГ-№6

Цутгасан бүтэц/Type of pour: ХЯАССНИ ХЭТЭ

Стандарт/Standard: MNS 1185:1998, MNS EN 206:2017

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	13.5 м <sup>3</sup>
2	Төслийн бат бэх (28-day strength)	Мпа   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	С   В   М	C16/20 АЕ
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	7,5
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	13,3
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	200
7	Агаар агуулалт (Air content)	%	5,7
8	Авсан бетон сорьцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	Sika SS10
10	Дүүргэгчийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20
11	Хлорын агууламж (Content of chloride ion)	%	-

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/: С.Цэдэнсодном

Гарын үсэг/Signature/:

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/:

Гарын үсэг/Signature/:

# СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ  
Quality certification of ready mixed concrete

№ 0009627

Огноо/Date: 2024 04 21 (Тест хийсэн цаг/Time of testing: 17:20)

Захиалагч компани/Contractor: М-Сн-Эс прораект

Төслийн нэр/Name of the project: БАЭН ХЭНДНИЙ

Байршил/Location: ДУГААН - ХУДАГ - 910

Цутгасан бүтэц/Type of pour: ДХ - 910

Стандарт/Standard: MNS 1185:1998, MNS EN 206:2017

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	303
2	Төслийн бат бэх (28-day strength)	Мпа   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	C   B   M	C16/20AE
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	16.0
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	14.3
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	200
7	Агаар агуулалт (Air content)	%	5.2%
8	Авсан бетон сорьцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	Sika SS10
10	Дүүргэгчийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20
11	Хлорын агууламж (Content of chloride ion)	%	-

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/

Гарын үсэг/Signature/

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/

Гарын үсэг/Signature/

Э. БАЯРБААТ  
*[Signature]*

# СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ  
Quality certification of ready mixed concrete

№ 0009627

Огноо/Date: 2024.04.21 (Тест хийсэн цаг/Time of testing: 17:20)  
Захиалагч компани/Contractor: М-Сн-Эс прораект  
Төслийн нэр/Name of the project: БАЭН ХЭНДЭН  
Байршил/Location: ЦУМАН - ХУДАГ - 9.10  
Цутгасан бүтээц/Type of pour: 3x - 9.10  
Стандарт/Standard: MNS 1188:1998, MNS EN 206:2017

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	3m <sup>3</sup>
2	Төслийн бат бэх (28-day strength)	Mpa   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	C   B   M	C16/20B
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	16.0
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	14.8
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	200
7	Агаар агуулалт (Air content)	%	5.2%
8	Авсан бетон сорьцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	Sika SS10
10	Дүүргэгчийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20
11	Хлорын агууламж (Content of chloride ion)	%	-

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/:

Гарын үсэг/Signature/:

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/:

Гарын үсэг/Signature/:

# PREMIUM

BUILDING MATERIALS

## СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ  
Quality certification of ready mixed concrete

№ 0009614

Огноо/Date: 2024.04.20 Тест хийсэн цаг/Time of testing: 16:50

Захиалагч компани/Contractor: М-Сү-Эс прорабарту

Төслийн нэр/Name of the project: Баянхонгор

Байршил/Location: Булаан-хуучаг 5-6

Цутгасан бүтэц/Type of pour: ЦАМ

Стандарт/Standard: MNS 1185:1998, MNS EN 206:2017

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	35m <sup>3</sup>
2	Төслийн баг бэх (28 day strength)	Mpa   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	C   B   M	C16/20A/E
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	23.6
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	19.9
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	200
7	Агаар агуулалт (Air content)	%	5.3%
8	Авсан бетон сорьцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	SIKA5510
10	Дуургийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20
11	Хлорын агууламж (Content of chloride ion)	%	-

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/

Гарын үсэг/Signature/

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/

Гарын үсэг/Signature/

# PREMIUM

BUILDING MATERIALS

## СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ  
Quality certification of ready mixed concrete

№ 0009616

Огноо/Date: 2024.04.18 Тест хийсэн цаг/Time of testing: 15:20

Захиалагч компани/Contractor: М.С. ЭС ПРОЕКТИ

Төслийн нэр/Name of the project: Баян Хөвдөг

Байршил/Location: ДУГААН: ХӨВДӨГ - 10

Цутгасан бүтэц/Type of pour: ДХ-10

Стандарт/Standard: MNS 1185:1998, MNS EN 206:2017

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	3.5м <sup>3</sup>
2	Төслийн бат бэх (28 day strength)	Mpa   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	C   B   M	C16/20AЕ
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	18.6
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	17.8
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	200
7	Агаар агуулалт (Air content)	%	5.2%
8	Авсан бетон сорьцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	Sika 5510
10	Дүүргэгчийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20
11	Хлорын агууламж (Content of chloride ion)	%	-

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/

Гарын үсэг/Signature/

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/

Гарын үсэг/Signature/



# СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ

Quality certification of ready mixed concrete

Standard/Standard MNS 1185 1998, MNS EN 206 2011

№ 0013149

Огноо/Date: 2024.09.05 Тест зүйсний цаг/Time of testing: 22:00

Захиалагч компани/Contractor: М-С-Эс Проперти

Төслийн нэр/Name of the project: БААН ХЭНГЭН

Байршил/Location: Үзрхэлц КЭТГ

Цутгасан бүтэц/Type of pour: ДУЛААХИ - ХУЛУУГ 1

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	11 м <sup>3</sup>
2	Төслийн бэлтгэл (28-day strength)	Мпа   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	C   B   M	C16/20AЕ
4	Гадна орны температур (Ambient temperature)	°C	12.9
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	19.2
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, Flow)	mm	210
7	Агаарын агууламж (Air content)	%	4.9%
8	Авсан бетон сорцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	SIVASS10
10	Дүүргэлтийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/

Гарын үсэг/Signature/

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/

Гарын үсэг/Signature/



**PREMIUM**  
Building Materials

# СЕРТИФИКАТ

**Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ**

Quality certification of ready mixed concrete

Standard/Standard MNS 1185 1998, MNS EN 206 2017

№2

**0013229**

Өдөр/Date **2024. 09. 23** Тест хийсэн цаг/Time of testing **19:20**

Захиалагч компани/Contractor **М-Сн-Эс прораект**

Төслийн нэр/Name of the project **БААН ХӨНӨН**

Байршил/Location **Урхайн хэв**

Цугласан бүтээц/Type of pour **Ах-2 хана**

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Энгийн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	<b>125м<sup>3</sup></b>
2	Тестийн бат бэх (28 day strength)	Мпа   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/алги (Class of concrete)	C   B   M	<b>C16/20AЕ</b>
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	<b>18.0</b>
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	<b>20.9</b>
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	<b>210</b>
7	Агаарын агуулга (Air content)	%	<b>5.1%</b>
8	Аасан бетон сорцлын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	<b>SNAB810</b>
10	Дүүргэгчийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	<b>20</b>

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/

**Б.Томилуцаа**  
*[Signature]*

Гарын үсэг/Signature/

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/

**Э.Баярсүх**  
*[Signature]*

Гарын үсэг/Signature/

# PREMIUM

BUILDING MATERIALS

## СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ  
Quality certification of ready mixed concrete

№ 0009612

Огноо/Date: 2024.04.17 Тест хийсэн цаг/Time of testing: 11:15  
Захиалагч компани/Contractor: М-Си-Эс Проперти  
Төслийн нэр/Name of the project: Баянхэнцүү  
Байршил/Location: ДУМАН - ХУХ - 9  
Цутгасан бүтэц/Type of pour: ДХ - 9  
Стандарт/Standard: MNS 1185:1998, MNS EN 206:2017

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	3x3
2	Төслийн баг бэх (28-day strength)	Мпа   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	C   B   M	C16/20AE
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	24.9
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	15.8
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	200
7	Агаар агуулалт (Air content)	%	5.3%
8	Авсан бетон сорьцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	SIKAS 10
10	Дүүргэгчийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20
11	Хлорын агууламж (Content of chloride ion)	%	-

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/

Гарын үсэг/Signature/

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/

Гарын үсэг/Signature/



PREMIUM  
Building Materials

# СЕРТИФИКАТ

Бетон зуурмагийн чанарын гэрчилгээ

Quality certification of ready mixed concrete

Standard/Standard MNS 1185:1998, MNS EN 206:2017

№ 0011776

Огноо/Date: 2024.05.16 Test хийсэн цаг/Time of testing: 17:00

Захиалагч компани/Contractor: М-Си-Эс Проперти

Төслийн нэр/Name of the project: Баян хачууч

Байршил/Location: Улаан-хутаг-7

Цугтасан бүтээц/Type of pour: ДХ-7

№	Үзүүлэлтийн нэр Name of parameter	Хэмжих нэгж Measurement	Үзүүлэлт Parameter
1	Нийлүүлсэн зуурмагийн хэмжээ (Pour size)	m <sup>3</sup>	11.8 m <sup>3</sup>
2	Төслийн бат бэх (28-day strength)	Мпа   кг/см <sup>2</sup>	-
3	Бетоны марк/анги (Class of concrete)	C   B   M	C16/20AT
4	Гадна орчны температур (Ambient temperature)	°C	35.6
5	Бетон зуурмагийн температур (Concrete temperature)	°C	23.8
6	Конусын суулт, тархалт (Slump, flow)	mm	200
7	Агаарын агууламж (Air content)	%	5.3%
8	Авсан бетон сорьцын тоо (Number of samples)	unit	-
9	Нэмэлтийн нэр төрөл (Type of admixture)	-	SIKASIO
10	Дүүргэгчийн хамгийн том хэмжээ (Maximum size of aggregate)	mm	20

Хүлээн авсан инженер /Name of contractor's engineer/:

Гарын үсэг/Signature/:

Шинжилгээ хийсэн хяналтын инженер /Name of Control engineer/:

Гарын үсэг/Signature/:



"Юу Эм Эс" ХХК

Барилгын материалын сорилтын  
лабораторийн шинжилгээний дүнУлаанбаатар хот Баянгол дүүрэг  
20 -р хороо Эрчим хүчний гудамж

Захиалагч	"Премиум бьюдинг материалс" ХХК Баян хэндий төсөл
Дээжийн нэр төрөл	Бетон сорьц
Объектын нэр	MCSP Дулааны худаг - 9, 10 /17:04/
Бетоны марк, анги	C 16/20 AE
Мөрдсөн стандарт	MNS 1272:99 / MNS EN 206:2017
Дээжийн дугаар	БС2404262
Хэвлэсэн огноо	5/24/2024

Он сар өдөр		Бэхжсэн нөхцөл, хоног	Сорьцын хэмжээ (см)	Сорьцын жин (г)	Сорьцын нягт (г/см³)	Эвдсэн хүч (кН)	Бетоны шахалтын бат бэх (МПа)	
Хэвлэсэн	Туршсан						Тус бүр	Дундаж
4/21/2024	5/19/2024	Ердийн 28 хоног	10x10x10	2330	2.33	365.82	34.8	33.9
			10x10x10	2320		363.14	34.5	
			10x10x10	2340		341.41	32.4	

Шинжилгээний үр дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн зөвхөн энэ дээжинд хамаарах ба шинжилгээний дүнг олшруулан хэрэглэх, хувилахыг хориглоно.

Лабораторийн эрхлэгч

Шинжилгээ хийсэн



/Б.Чингүнжав/

/Г.Оргилболд/



## "Юу Эм Эс" ХХК

Барилгын материалын сорилтын  
лабораторийн шинжилгээний дүн



Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг  
20 -р хороо Эрчим хүчний гудамж

Захиалагч	"Премиум бьюдинг материалс" ХХК Баян хөндий төсөл
Дээжийн нэр төрөл	Бетон сорьц
Объектын нэр	MCSP Дулааны худаг-10 /15:41/
Бетоны марк, анги	C 16/20 АЕ
Мөрдсөн стандарт	MNS 1272:99 / MNS EN 206:2017
Дээжийн дугаар	БС2404256
Хэвлэсэн огноо	5/19/2024

Он сар өдөр		Бэхжсэн нөхцөл, хоног	Сорьцын хэмжээ (см)	Сорьцын жин (г)	Сорьцын нягт (г/см³)	Эвдсэн хүч (кН)	Бетоны шахалтын бат бэх (МПа)	
Хэвлэсэн	Туршсан						Тус бүр	Дундаж
4/18/2024	5/16/2024	Ердийн 28 хоног	10x10x10	2310	2.31	299.87	28.5	29.8
			10x10x10	2300		317.11	30.1	
			10x10x10	2320		325.37	30.9	

Шинжилгээний үр дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн зөвхөн энэ дээжинд хамаарах ба шинжилгээний дүнг олшруулан хэрэглэх, хувилахыг хориглоно.

Лабораторийн эрхлэгч

Шинжилгээ хийсэн

/Б.Чингүнжав/

/Г.Оргилболд/



"Юу Эм Эс" ХХК

Барилгын материалын сорилтын  
лабораторийн шинжилгээний дүнУлаанбаатар хот Баянгол дүүрэг  
20 -р хороо Эрчим хүчний гудамж

Захиалагч	"Премиум бьулдинг материалс" ХХК Баян хөндий төсөл
Дээжийн нэр төрөл	Бетон сорьц
Объектын нэр	MCSP Дулааны худаг-5, 6 /16.33/
Бетоны марк, анги	C 16/20 АЕ
Мөрдсөн стандарт	MNS 1272:99 / MNS EN 206:2017
Дээжийн дугаар	БС2404260
Хэвлэсэн огноо	5/19/2024

Он сар өдөр		Бэхжсэн нөхцөл, хоног	Сорьцын хэмжээ (см)	Сорьцын жин (г)	Сорьцын нягт (г/см³)	Эвдсэн хүч (кН)	Бетоны шахалтын бат бэх (МПа)	
Хэвлэсэн	Туршсан						Тус бүр	Дундаж
4/20/2024	5/18/2024	Ердийн 28 хоног	10x10x10	2370	2.35	381.99	36.3	34.8
			10x10x10	2330		344.94	32.8	
			10x10x10	2350		372.61	35.4	

Шинжилгээний үр дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн зөвхөн энэ дээжинд хамаарах ба шинжилгээний дүнг олшруулан хэрэглэх, хувилгахыг хориглоно

Лабораторийн эрхлэгч

Шинжилгээ хийсэн

/Б.Чингүнжав/

/Г.Оргилболд/



## "Юу Эм Эс" ХХК

Барилгын материалын сорилтын  
лабораторийн шинжилгээний дүн



Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг  
20-р хороо Эрчим хүчний гудамж

Захиалагч	"Премиум бьюлдинг материалс" ХХК Баян хөндий төсөл
Дээжийн нэр төрөл	Бетон сорьц
Объектын нэр	MCSP Дулааны худаг /16:55/
Бетоны марк, анги	C 16/20 AE
Мөрдсөн стандарт	MNS 1272:99 / MNS EN 206:2017
Дээжийн дугаар	BC2404294
Хэвлэсэн огноо	5/30/2024

Он сар өдөр		Бэхжсэн нөхцөл, хоног	Сорьцын хэмжээ (см)	Сорьцын жин (г)	Сорьцын нягт (г/см³)	Эвдсэн хүч (кН)	Бетоны шахалтын бат бэх (МПа)	
Хэвлэсэн	Туршсан						Тус бүр	Дундаж
4/29/2024	5/27/2024	Ердийн 28 хоног	10x10x10	2320	2.34	358.97	34.1	33.4
			10x10x10	2340		345.75	32.8	
			10x10x10	2370		351.38	33.4	

Шинжилгээний үр дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн зөвхөн энэ дээжинд хамаарах ба шинжилгээний дүнг олшруулан хэрэглэх, хувилахыг хориглоно.

Лабораторийн эрхлэгч

Шинжилгээ хийгч



/Б.Чингүнжав/

/Г.Оргилболд/



## "Юу Эм Эс" ХХК

Барилгын материалын сорилтын  
лабораторийн шинжилгээний дүн



Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг  
20 -р хороо Эрчим хүчний гудамж

Захиалагч	"Премиум бьулдинг материалс" ХХК Баян хөндий төсөл
Дээжийн нэр төрөл	Бетон сорьц
Объектын нэр	MCSP Дулааны худаг-9 /10:54/
Бетоны марк, анги	C 16/20 АЕ
Мөрдсөн стандарт	MNS 1272:99 / MNS EN 206:2017
Дээжийн дугаар	БС2404248
Хэвлэсэн огноо	5/19/2024

Он сар өдөр		Бэхжсэн нөхцөл, хоног	Сорьцын хэмжээ (см)	Сорьцын жин (г)	Сорьцын нягт (г/см³)	Эвдсэн хүч (кН)	Бетоны шахалтын бат бэх (МПа)	
Хэвлэсэн	Туршсан						Тус бүр	Дундаж
4/17/2024	5/15/2024	Ердийн 28 хоног	10x10x10	2330	2.33	348.91	33.1	32.8
			10x10x10	2320		341.93	32.5	
			10x10x10	2330		345.44	32.8	

Шинжилгээний үр дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн зөвхөн энэ дээжинд хамаарах ба шинжилгээний дүнг олшруулан хэрэглэх, хувилахыг хориглоно.

Лабораторийн эрхлэгч

Шинжилгээ хийсэн

/Б.Чингүнжав/

/Г.Оргилболд/



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

# ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар: ОВД0002093



СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

*Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр*

**Ажлынхүйн нэгж, байгууллага/иргэн:**

Нэр: "АРВАЙН ДЭВШИЛ" ХХК РД: 5172152

Утас/Факс: 99328958, 99032252

И-мэйл: arvaindevshil@gmail.com

Хаяг: МОНГОЛ УЛС, ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, АРВАЙХЭЭР СУМ, 12-Р БАГ, ЗҮЛЭГТ, ҮЙЛДВЭР, ТЭЛ 6, 601 ТООТ

**Энэхүү гэрчилгээг олгоход үндэслэсэн баримт, бичгүүд:**

1. Сорилтын дүнгийн дугаар, огноо: КБМХЭЛ 97/21, 2021.11.22
2. Сорилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр: БАК-ын нэгдсэн лаборатори
3. Удирдлагын тогтолцооны нэр, гэрчилгээний дугаар, олгосон байгууллагын нэр: БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР 2022.01.14, №01/22

**Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тодорхойлолт:**

1 КЕРАМИК ТООСГО-АРВАЙН ДЭВШИЛ ТООСГОНЫ ҮЙЛДВЭР

6808

0138:2010



Дээрхи бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичиг (НТББ)-ийн шаардлагыг хангаж байгаа тул энэхүү ГЭРЧИЛГЭЭ-г олгов.



PC 03



2022-01-14

Олгосон огнио

2022-01-14

Дуусах огнио



# ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ



## БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА № 404/22

**Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл:**

Нэр: "УЛААНБААТАР МЕНЕЖМЕНТ" ХХК  
Хаяг: УБ хот, 20-р, УБ БҮК-УБ мөнөжментийн байр  
Утас: 70002903, 99105333, 91916855  
И-мэйл хаяг: contact@ubmanagement.mn

**Энэхүү гэрчилгээг олгоход үндэслэсэн баримт бичгүүд:**

- Сорилтын үр дүнгийн огноо, дугаар:  
Ган туйван иржгэр-D32мм 2022.02.28 RE0057, D28 2022.02.28 RE0057, D25 2022.02.28 RE0057, D22 2022.02.28 RE0057, D20 2022.02.28 RE0057, D18 2022.02.28 RE0057, D16 2022.02.28 RE0057, D14 2022.02.28 RE0057, D12 2022.02.28 RE0057, D10 2022.02.28 RE0057, D8 2022.02.28 RE0057, D32мм- D10мм 2022.08.22 RE1071
- Сорилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр:  
БХТ-ийн БМСШ-ний итгэмжлэгдсэн лаборатори  
ШУТИС-ийн МөхТС-ын Металын сорилт, туршилт эрдэм шинжилгээний төвийн лаборатори
- Баталгаажуулалтын шийдвэр:  
Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2022.11.30-ны өдрийн хурлын шийдвэр, БХТөвийн захирлын 2022.12.07-ны өдрийн А/653 тоот тушаал

**Бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний тодорхойлолт:**

Нэр/Тоо хэмжээ  
**ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦИЙН  
ИРЖГЭР ГАН ТУЙВАН**  
/SD490 D10, D12, D14  
D16, D18, D20  
D22, D25, D28, D32мм/  
ИМПОРТ ОХУ-аас/

БТКУС-ийн код  
**7214.20.00**

Стандарт, НТББ-ийн тэмдэглэгээ:  
**MNS JIS G 3112:2002**



*УБ-аас - 20 тундөрөг ХХК  
2024 оны нугааран авалжууд  
дээр нөөц олгов.*

Дээрх бүтээгдэхүүн/үйлчилгээ нь холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичиг (НТББ)-ийн шаардлагыг хангаж байгаа тул энэхүү **ГЭРЧИЛГЭЭ-г олгов.**

*(Арматур)*



Баталгаажуулалтын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан:  
**УЛААНБААТАР МЕНЕЖМЕНТ ХХК**  
**Д.Батням**  
Гарын үсэг  
ТТА7992 н.5164753



Олгосон огноо  
2022.12.07  
Дуусах огноо  
2025.12.07

*Арматур*



# ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ



## БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА

№ 411/22

**Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл:**

Нэр: "УЛААНБААТАР МЕНЕЖМЕНТ" ХХК  
Хаяг: УБ хот, 20-р, УБ БҮК-УБ менежментийн байр  
Утас: 70002903, 99105333, 91916855  
И-мэйл хаяг: contact@ubmanagement.mn

**Энэхүү гэрчилгээг олгоход үндэслэсэн баримт бичгүүд:**

1. Сорилтын үр дүнгийн огноо, дугаар:  
Гөлгөр ган туйван D10 2022.02.28 RE0057, D8 2022.02.28 RE0057, D6.5 2022.02.28 RE0057  
D10, D8, D6,5 2022.08.25 RE1071
2. Сорилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр:  
БХТ-ийн БМСШ-ний итгэмжлэгдсэн лаборатори  
ШУТИС-ийн МехТС-ын Металын сорилт, туршилт эрдэм шинжилгээний төвийн лаборатори
3. Баталгаажуулалтын шийдвэр:  
Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2022.11.30-ны өдрийн  
хурлын шийдвэр, БХТөвийн захирлын 2022.12.07-ны өдрийн А/653 тоот тушаал

**Бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний тодорхойлолт:**

Нэр/Тоо хэмжээ  
**ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦИЙН  
ГӨЛГӨР ГАН ТУЙВАН**  
SR295 D6.5мм, D8мм, D10мм  
ИМПОРТ ОХУ-аас/

БТКУС-ийн код  
**7214.20.00**

Стандарт, НТББ-ийн тэмдэглэгээ:  
**MNS JIS G 3112:2002**



*М-ли-Э Трансервис ХХК*  
*2024 оны гурвандугаар сарын 28 өдөр*

Дээрх бүтээгдэхүүн/үйлчилгээ нь холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичиг (НТББ)-ийн шаардлагыг хангаж байгаа тул энэхүү **ГЭРЧИЛГЭЭ**-г олгов.

*(каталка)*



Олгосон огноо  
2022.12.07  
Дуусах огноо  
2025.12.07

*Арматур*



# ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ



## БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА

№ 521/23

**Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл:**

Нэр: "ВАКУМ ЦОНХ" ХХК  
Хаяг: УБ, БЗД, 11-р хороо, Ногоон зoorь, 53 тоот  
Утас: 99117342, 88250125  
И-мэйл хаяг: Vakum.tsonkh.llc@gmail.com

**Энэхүү гэрчилгээг олгоход үндэслэсэн баримт бичгүүд:**

- Сорилтын үр дүнгийн огноо, дугаар:  
5 камертай хуванцар цонх 2023.09.08 Wi1232/2, 6 камертай хуванцар цонх 2023.09.22 Wi1333
- Сорилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр:  
БХТ-ийн БМСШ-ний итгэмжлэгдсэн лаборатори
- Баталгаажуулалтын шийдвэр:  
Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2023.10.19-ний өдрийн 14 дүгээр хурлын шийдвэр, Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2023.10.20-ний өдрийн А/523 дугаар тушаал

**Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт:**

Нэр/Тоо хэмжээ  
**БАРИЛГЫН ХУВАНЦАР  
ЦОНХ, ХААЛГА  
/T5-0.63м<sup>2</sup>х<sup>0</sup>С/вт/**

Стандарт, НТББ-ийн тэмдэглэгээ:  
**MNS 5830:2007  
MNS 5802:2007**

Дээрх бүтээгдэхүүн/ үйлчилгээ нь холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичиг (НТББ)-ийн шаардлагыг хангаж байгаа тул энэхүү ГЭРЧИЛГЭЭ-г олгов.



Баталгаажуулалтын байгууллагын  
эрх бүхий албан тушаалтан:

**Ц.Амарсанаа**  
гарын үсэг



Баталгаажуулалтын  
шийжээч:

**М.Батчимэг**  
гарын үсэг

Олгосон огноо  
2023.10.20  
Дуусах огноо  
2024.10.20



ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА,  
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ  
**БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ**

Их тойруу 1, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15171  
Утас: 32 07 34, Факс: (976-11) 32 03 38,  
Цахим шуудан: info@barilga.gov.mn

2025. 02. 13 № 01/320

танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -г

**ВАКУМ ЦОНХ ХХК -Д**

Танай компанийн ирүүлсэн "Хүсэлт гаргах тухай" 2025 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/25-7 дугаар албан бичигтэй танилцлаа.

Барилгын нэгдсэн мэдээллийн систем ([www.mvis.gov.mn](http://www.mvis.gov.mn)) -ээр тохирлын гэрчилгээний хүсэлт, баримт бичгүүдийг хүлээн авч хянан шалгаж байна.

Тохирлын гэрчилгээ шинээр олгох асуудлыг Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.

ЗАХИРАЛ



Т.ПҮРЭВХАТАН

1525009\*9



М-СИ-ЭС ПРОПЕРТИ ХХК-д

ОНЦИГОЛ БАЙДЛЫН ТРОНХИЙ ГАЗАР  
ГАМШИГ СУДАЛЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЛЭНГИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Төрийн газар: Сүхбаатар дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 14250  
Утас: 26 12 53, Факс: (976-51) 26 28 46,  
Цахим хуудал: [www.nema.gov.mn](http://www.nema.gov.mn),  
Цахим хуудас: [www.nema.gov.mn](http://www.nema.gov.mn)

2025.04.10 № 14/мэ  
Тайлбар 2025.03.25-ны № 102

Галын лабораторийн сорилтын дүн  
Дугаар: № 79 / 132

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/ч О.Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв.

1	Протоколын дугаар	№ 3765 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	YJV 2*2.5+1*2.5mm <sup>2</sup> CU/XLPE/PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн.

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207:2007 ГОСТ 30402-96
3	Делний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТУ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛЭГЧ

О. БАТБОЛД  
/овог нэр, гарын үсэг/

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно.

1425051508



ОШНГОЙ БАЙДЛЫН ГРОИНИЙ ГАЗАР  
ГАМНИНГ СУДАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Патогийн гудамж, Сүхбаатар дүүрэг,  
Улаанбаатар хот 14240  
Утас: 20 52 51, Факс: (976-51) 20 20 46,  
Цахим хуудал: mck@oema.gov.mn,  
Цэвэр хуудас: www.oema.gov.mn

2025.04.10 № 44/141  
Танай 2025.03.25 Тий № 102 -Т

## Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар: № 79 / 131

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан тушаал: д/ч О Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын  
25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт,  
шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв.

1	Протоколын дугаар	№ 3764 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар тэмдэглэгээ	YJV 4*120+1*70mm <sup>2</sup> CU/XLPE/PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн үгэрлэлийн эвчлэг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх.
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр - 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207:2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТУ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт  
нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭЭСЛЭГЧ

О. БАТБОЛДУ  
/товот, нэр, гарын үсэг/

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно.

1425051506



ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ТАГААР  
ГАНШИНГ СУДАЛГААНЫ  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
АЮУЛГУЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Парламентуудын, Сүхбаатар дүүрэг  
Улаанбаатар хот-14250  
Утас: 26 12 51, Факс: (976-51) 29 28 48  
Цахим шуудан: neta@neta.gov.mn,  
Цахим хуудас: www.neta.gov.mn

2025.04.10 № 102  
Тайлбар: 2025.03.25 № 102

Галын лабораторийн сорилтын дүн  
Дугаар: № 79 / 130

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/ч О.Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв

1	Протоколын дугаар	№ 3783 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	YJV 4*10+1*10mm <sup>2</sup> CU/XLPE/PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угсралтын ажлын хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг


Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207-2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТУ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЮУЛГУЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛЭГЧ

 О. БАТБОЛД  
Товч, нэр, гарын үсэг



Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно

1425051504



ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
ГАНШИН СУДАЛЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭГИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Порталын үндэсн. Сүхбаатар дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 14250.  
Утас: 29 12 83, факс: (976-31) 29 28 48  
Цахим хуудал: www.nemc.gov.mn  
Цахим хуудал: www.mn.gov.mn

2025.04.10 № 14/139  
2025.03.25 ны № 102

Галын лабораторийн сорилтын дүн  
Дугаар № 79 / 129

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК  
Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/м О.Батболд  
Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын  
25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт,  
шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв

1	Протоколын дугаар	№ 3762 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	YJVVRP 6*1.5+1*1.5mm <sup>2</sup> CU/XLPE/OAS/PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, парти, булаг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угаралтын шилж хийж гүйцэтгэн байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах энгилал	D2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207-2007 ГОСТ 30403-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	TУ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт  
нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛЭГЧ О.БАТБОЛДУ  
Товч нэр, гарын үсэг



Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно.

1425051502



ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БРОНХИЙ ГАЗАР  
ГАНШИГ СУДГАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Парлааны гудамж, Буюуцагч дугуй  
Улаанбаатар хот 14253  
Утас: 28 12 53 Факс: (976 51) 28 20 40  
Цахим илгүүдэл: [ndf@nema.gov.mn](mailto:ndf@nema.gov.mn)  
Цахим хуудас: [www.ndf.nema.gov.mn](http://www.ndf.nema.gov.mn)

2025.04.10 № 14/138  
Тайлбар: 2025.03.25 № 102

## Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар № 79 / 128

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/ч О Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын  
25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт,  
шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв.

1	Протоколын дугаар	№ 3761 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	KVVRP 19*1,5+1*1,5 mm <sup>2</sup> , 0.45/0.75kV PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери шинж чанар бусад шаардлагагай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн утэралтын ажил хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207:2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТУ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР ДЭСЛЭГЧ

О. Батболд /О БАТБОЛД/  
Товчоо, нэр, гарын үсэг

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно

1425051500



ОНЦСЫН БАЙДРЫН ТӨВӨННИ ТАГАР  
ГАНШИГ СУДАЛГААНЫ  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭГИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Парламент газрын сууцалбар дугаар  
Улаанбаатар хот, 14250  
Утас 76 12 55 Факс (976 41) 76 24 48  
Төвний газрын нэгж (Солонгос улс)  
Төвний хэргийн www.ncs.gov.mn

2025.04.10 № 14/138  
Газрын 2025.03.25 ны № 100

Галын лабораторийн сорилтын дүн  
Дугаар № 79 / 127

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, М-Си-Эс проперти ХХК  
Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал д/ч О.Батболд  
Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын  
25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт,  
шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв

1	Протоколын дугаар	№ 3760 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар тэмдэглэгээ	YJVRP 10*1.5*1*1.5 mm2 PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, булаг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхендий голсийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн утралтын шиллэг хийн гүндэтгэн байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	D2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207 2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	TY2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамраарагдана. Дүгнэлт  
нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР ДЭСДЭГЧ

О.БАТБОЛД  
Төвөгч нэр, гарын үсэг

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно

1425051498



ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
ГАНШИГ СУДАЛГААНЫ  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Төрийн газрын Сүхбаатар дүүрэг  
Улаанбаатар хот 14250  
Утас: 28 12 41, факс: 276-51-20, 28-46  
Цахим хуудал: www.geology.gov.mn  
Мэйл: gsa@geology.gov.mn

дэрс. 04.10 № 14/156  
дэрс. 03.25 № 102

Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар: № 79 / 126

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/ч О.Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн №102 тоот албан бичиг, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв.

1	Протоколын дугаар	№ 3759 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	YJVRP 1*2+1*1.5 mm2 PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн үгэрлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх.
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	D2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207.2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	TY2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛЭГЧ

О. БАТБОЛДУ  
/овог нэр, гарын үсэг/

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно.

1425051496



М-СИ-ЭС ПРОПЕРТИ ХХК-д

Хавсралт - 6



М-СИ-ЭС ПРОПЕРТИ ХХК-д

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БРОНХИЙ ГАЗАР  
ГАМШИГ СУДЛАХЫН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЛЭНИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Патриархын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг  
Улаанбаатар хот, 14250  
Утас: 20 12 53; Факс: (075-51) 26 26 46  
Цахим шуудан: info@nema.gov.mn  
Цалин хуудас: www.nema.gov.mn

дэвсгэр 04.10 № 14/185  
Танхим 08.25 № 102

Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар № 79 / 125

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/ч О Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын

25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт,

шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв

1	Протоколын дугаар	№ 3758 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	YJV 4*240+1*120mm <sup>2</sup> 0.6/1kV, CU/XLPE/PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207:2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТУ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР ДЭСЛЭГЧ

О.С. БАТБОЛД  
/овог, нэр, гарын үсэг/

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно

1425051494

2004



ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БРӨНХИЙ ТАТАР  
ТАМШИГ СУЛЛАЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЛЭГЧИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Палгизаны гудамж, Сүхбаатар дүүрэг,  
Улаанбаатар хот 14250  
Утас: 20 12 53, Факс: (070-51) 26 28 48  
Цахим илүүдэл: oia@oia.gov.mn  
Цахим хуудас: www.oia.gov.mn

2025.04.10 № 14/154  
Саран: 2025.08.25 -ийн № 100

Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар № 79 / 124

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал, д/ч О.Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв.

1	Протоколын дугаар	№ 3757 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	УJV 4*70+1*35mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, CU/XLPE/PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр -- 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025 04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207-2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТУ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛЭГЧ О. БАТБОЛД  
/овог, нэр, гарын үсэг/

Сорилтын дүнг хувилж олишруулбал хүчингүйд тооцно.

1425051492



ОРИГОЙ БАЙДЛЫН ГРОНХИЙ ГАЗАР  
ГАНШИГ СУДЛАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭГЭНИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Парламент газрын, Судалгааны дугаар  
Утас: 33102400, 14200  
Утас: 26 12 51, Факс: 331 25 24 89  
Цахим хуудал: www.geoinfo.gov.mn  
Цахим хуудал: www.geoinfo.gov.mn

дэвсгэр 04.10 № 14/133  
Тайлбар дэвсгэр 04.10 - ны № 102

Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар. № 79 / 123

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан тушаал: д/ч О.Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт цахилгааны кабелийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв.

1	Протоколын дугаар	№ 3756 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар тэмдэглэгээ	YJV 3*25+1*16mm <sup>2</sup> , 0.6/1kv, CU/XLPE/PVC
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт бүлэг сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угсралтын ажлаар хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	D2 (дунд зэрэг дөглөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207, 2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТУ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛЭГЧ

О. БАТБОЛД  
Төвөг нэр гарын үсэг

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно.

1425051490



ЭНГЦЭЙ БАЙДЛЫН БРОНХИЙ ГАЗАР  
ГАНШИГ СУДИАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАНДЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Партизань гудамж, Сүхбаатар дугуйр,  
Улаанбаатар хот 14250  
Утас: 26 12 53, Факс: (979-51) 26 28 46,  
Цахим хуудал: info@mcsc.gov.mn,  
Цахим хуудас: www.mcsc.gov.mn

2025.04.10 № 14/32  
Тайлбар 2025.08.25-ны № 102 -Т

Галын лабораторийн сорилтын дүн  
Дугаар № 79 / 122

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК  
Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан тушаал: д/ч О.Батболд  
Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв

1	Протоколын дугаар	№ 3755 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	WDZ-YJV 2C+E 1.5 mm2, CU/XLPE/LSZH
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207:2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТҮ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭЭСЛЭГЧ О. БАТБОЛД  
/овог, нэр, гарын үсэг/

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно

1425051488



ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХӨН ГАЗАР  
ТАМШИГ СУДАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭГИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Барууны дүрвэл, Сүхбаатар дүүрэг  
Улаанбаатар хот 14250  
Утас 20 12 53, Факс: (976-51) 20 28 46,  
Цахим хуудал: [std.mn](http://std.mn), [www.mn](http://www.mn)  
Цахим хуудал: [www.mn](http://www.mn), [www.mn](http://www.mn)

2025.04.10 № 14/131

Тангир 2025.03.25 ТНМ А/ 102 -1

## Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар № 79 / 121

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/ч О.Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл. Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв.

1	Протоколын дугаар	№ 3754 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	CAT6 24awg (Unshielded 24 AWG BARE COPPER)
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	ШЗ (хэвийн шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	ДЗ (хялбар деллөж авалцан эсдэг)	MNSGOST 21207-2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТҮЗ (дунд зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛӨГЧ

О. БАТБОЛД  
Товоо, нэр, гарын үсэг

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно.

1425051486



ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ТАААР  
ТАМНИН СУДАЛГААНЫ  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭГИЙН  
АЮУЛГУЙ БАЙДЛЫН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Цахим гурвалж, Сувбартай дээрх,  
Улаанбаатар хот, 14250  
Утас: 20 12 53, Факс: (976-51) 28 28 46  
Цахим хуудал: info@nema.gov.mn,  
Цахим хуудал: www.nema.gov.mn

дугаар 04.10 № 4/130  
таныг 2025.05.28 тэм № 102

Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар: № 79 / 120

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: М-Си-Эс проперти ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/ч О Батболд

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн №102 тоот албан бичигт, цахилгааны кабелийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв

1	Протоколын дугаар	№ 3753 / 25
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	WDZ-YJV Multicore 2C+E 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV CU/XLPE/LSZH
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Баянхонгор аймгийн Баянхөндий төслийн хүрээнд нийт барилга байгууламжийн угсралтын онцлог хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд уг барилга байгууламжуудын сүлжээний болон хүчний кабель гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	3 метр – 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2025.04.10

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207.2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	TY2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: АЮУЛГУЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛЭГЧ

О. БАТБОЛД  
Товог, нэр, гарын үсэг!

Сорилтын дүнг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно

1425051484
